



VESIKATON
KORJAUSRAPORTTI

30.08.2021



HIETASAARENTIE 7

Hietasaarentie 7, 90500 OULU

TILAAJA

Tilaaaja

Oulun Kaupunki, yhdyskunta ja ympäristöpalvelut

Tilaaajan yhteyshenkilö

Sakari Kela

KATTOTUTKA OY, YHTEYSTIEDOT

Kattotutka Oy:n yhteyshenkilö

Mikael Turtinen
0403547399
mikael.turtinen@kattotutka.fi

Raportin tekijä

Mikko Antila

TILAUSNUMERO: 21010376

Tilauksen kuvaus

Haluttu väliaikaisratkaisu pariksi vuodeksi seuraavasti:
käydään räystäät läpi, nostetaan nykyistä kermiä räystäällä ja lisätään räystäälle kermikaista joka limittyy vanhan kermin kanssa kaikille räystäille. Lisäksi asennetaan pätkä syöksytorvea (yhden syöksytorven yläpää puuttuu) ja tiivistetään massalla läpiviennit. Samalla katselmoidaan se aitan katto jonne ei tarkastaja päässyt.

TOIMENPIDE 1



Kaikki alaräystäät kierretty lisäkermillä. Syöksytoria ei asennettu. Kulmiin rakennettiin kermistä "ulosheittäjä"



Toimenpide jatkuu seuraavalla sivulla

Tilattu toimenpide


150 Katon korjaustöitä

1 erä(ä)

Jatkuu edelliseltä sivulta



Kahden piipun taukset putsattu ja tiivistetty bitumimassalla.

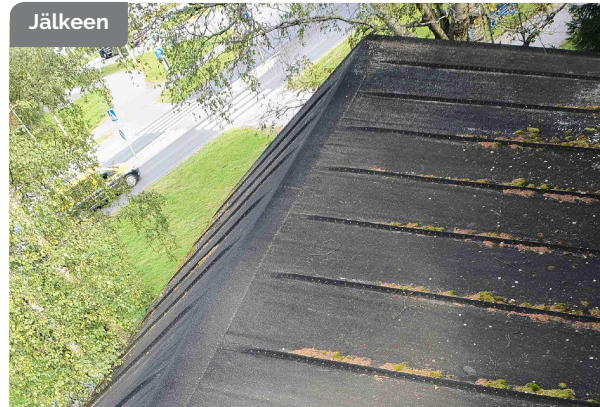

Piha rakennus katselmoitiin silmämääräisesti. Katolla runsaasti sammalta. katteessa ei havaittu reikiä tai suuria puutteita. Kermi elinkaarensa lopussa.

Toimenpide

Toimenpide tehty tilauksen mukaisesti.
